



Порядок використання
бюджетних коштів на
капітальні роботи для
об'єднаних громад
2016 рік

ФІНАНСУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 2016

ДЕДЛАЙНИ

виготовлення (коригування) ПКД – **12.07.2016**

експертиза проектно-кошторисної документації – **14.07.2016**

Для робіт, які
вимагають
розроблення
ПКД:

оголошення тендеру:

на очікувану вартість - **08.07.2016**

відповідно до проектно-кошторисної документації - **15.07.2016**

визначення переможця та акцепт пропозиції – **01.09.2016**

дозвіл на початок будівельних робіт – **05.09.2016**

початок робіт - **05.09.2016**

ФІНАНСУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 2016

ДЕДЛАЙНИ

затвердження кошторису - **11.07.2016**

оголошення тендеру - **12.07.2016**

Для робіт, які
можна
виконати за
дефектним
актом:

укладення договору - **20.08.2016**

початок робіт - **25.08.2016**

ФІНАНСУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 2016

ДЕДЛАЙНИ

Допорогові закупівлі

(для робіт – до 1,5
млн. грн., для
товарів та послуг
– до 200 тис. грн.)

виготовлення проектно-кошторисної документації та
затвердження кошторису – **12.07.2016**

оголошення закупівлі – **12.07.2016**

укладення договорів – **25.07.2016**

початок робіт – **01.08.2016**

СУБВЕНЦІЯ НА ІНФРАСТРУКТУРУ ОТГ

Проекти станом на 18.07.2016	Кількість	Сума субвенції, млн. грн.
Всього розроблено	105 + 6	45167,4 (включаючи проектні ідеї, які громади ще доопрацьовують)
Надано документи в Мінрегіон	104	44173,5
Отримано позитивний висновок Мінрегіону	77	31913,5

СУБВЕНЦІЯ НА ІНФРАСТРУКТУРУ ОТГ - переваги та проблеми

- **Переваги:**

- Відносна проста процедура отримання коштів (достатньо висновку з мокрою печаткою від Мінрегіона)
- Можливість подавати проекти без експертизи ПКД
- Чітко визначена сума фінансування для кожної громади – відсутні конкурсні засади

- **Проблеми:**

- Відсутність чіткого методичного інструментарію для написання проектів (кожного разу – нові зауваження від Мінрегіону)
- Неможливість узагальнити зауваження і доопрацювання, у зв'язку з тим що кожна громада відпрацьовує свої проекти окремо

СУБВЕНЦІЯ НА ІНФРАСТРУКТУРУ ОТГ - КЛЮЧОВІ ЗАУВАЖЕННЯ

- **Зауваження Мінрегіону:**

- Для проектів розробки ПКД – необхідне чітке розуміння, за рахунок якого джерела буде в майбутньому цей об'єкт будуватися (відхиляються дороговартісні об'єкти)
- Для проектів розробки генеральних планів – відхиляються проекти у зв'язку з розробкою відповідного законодавства для громад
- Довгобуди – відхиляються проекти, які неможливо завершити в поточному році.
- Закупівля техніки – необхідне чітке обґрунтування джерел коштів, які в наступні роки буде направлено на утримання парку техніки (комунальні, пожежні машини і т.д.)

СУБВЕНЦІЯ НА ІНФРАСТРУКТУРУ ОТГ - ПЛАН ДІЙ

Ключові етапи	Орієнтовна дата	Відповідальний
1. Доопрацювання проектів громад в Мінрегіоні	20.07.2016	Департамент економічної політики ЛОДА
2. Проведення останнього в цьому році засідання регіональної комісії	22.07.2016	Комісія по наданню висновків
3. Розгляд проектів на Комісії в Мінрегіоні	25.07.2016	Мінрегіон

Увага! Необхідне прискорення темпів розробки ПКД для об'єктів, які їй потребують!!!!

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ - ЯК ОТРИМАТИ КОШТИ?

Ключові етапи	Документ	Відповідальний
1. Затвердження Кабміном переліку проектів	Розпорядження КМУ від 08.06.2016 №432-р	КМУ, ЛОДА
2. Помісячний розподіл коштів	Вхідний лист Мінрегіону, пооб'єктний розподіл	Мінрегіон, ОДА
3. Проведення тендерних процедур (за потреби)	Не потрібен для робіт до 1,5 млн. грн., або для перехідних об'єктів	Замовник
4. Укладання угоди з підрядником	Договір	Замовник
5. Титули об'єктів (постанова 995 від 08.09.1997)	Погоджений ОДА та <u>Мінрегіоном</u> титул	Замовник, Мінрегіон
6. Довідки змін до кошторисів	Погоджена ОДА довідка	ОДА
7. Кошторис та помісячний план асигнувань	Погоджені ОДА кошторис та помісячний план асигнувань	Розпорядник коштів
8. Відкриття рахунків в органах ДКСУ	Довідка про відкриття рахунку	Розпорядник коштів
9. Виконання робіт, отримання коштів на рахунок (аванс – 30%)	Платіжні доручення	Підрядник, замовник


Що потрібно, щоб отримати кошти ДФРР

1. Титул об'єкта будівництва (тільки для будівництва та реконструкції, не потрібен для капітального ремонту)
 - Титули не виготовляються для проектів, які передбачають тільки закупівлю обладнання
 - Титул робите в 4 екземплярах і залишаєте в каб 422
 - Погодження – Мінрегіон
 - Затвердження – Замлинський Р.Т.
 - Підпис – розпорядник коштів
2. Довідка змін (необхідно забрати в каб 241 – бухгалтерія ЛОДА, тел. 2999143)
3. Кошторис та план асигнувань (робите на основі довідки змін – три екземпляри, погоджує Замлинський Р.Т.)
 - Необхідно проставити печатку ОДА (в канцелярії каб 227 або бухгалтерії каб 241). Одну копію плану асигнувань та кошторису **ЗАЛИШАЄТЕ В ЛОДА (каб 241)**
4. Лист на аванс 30% - погодження Мінрегіоном, підпис замовника, залишаєте в каб 422

ДФРР (об'єднані територіальні громади)

Загалом в об'єднаних громадах реалізується понад 140 проектів на суму 73 млн. грн.

ДФРР – 8 проектів на суму 15,5 млн. грн.

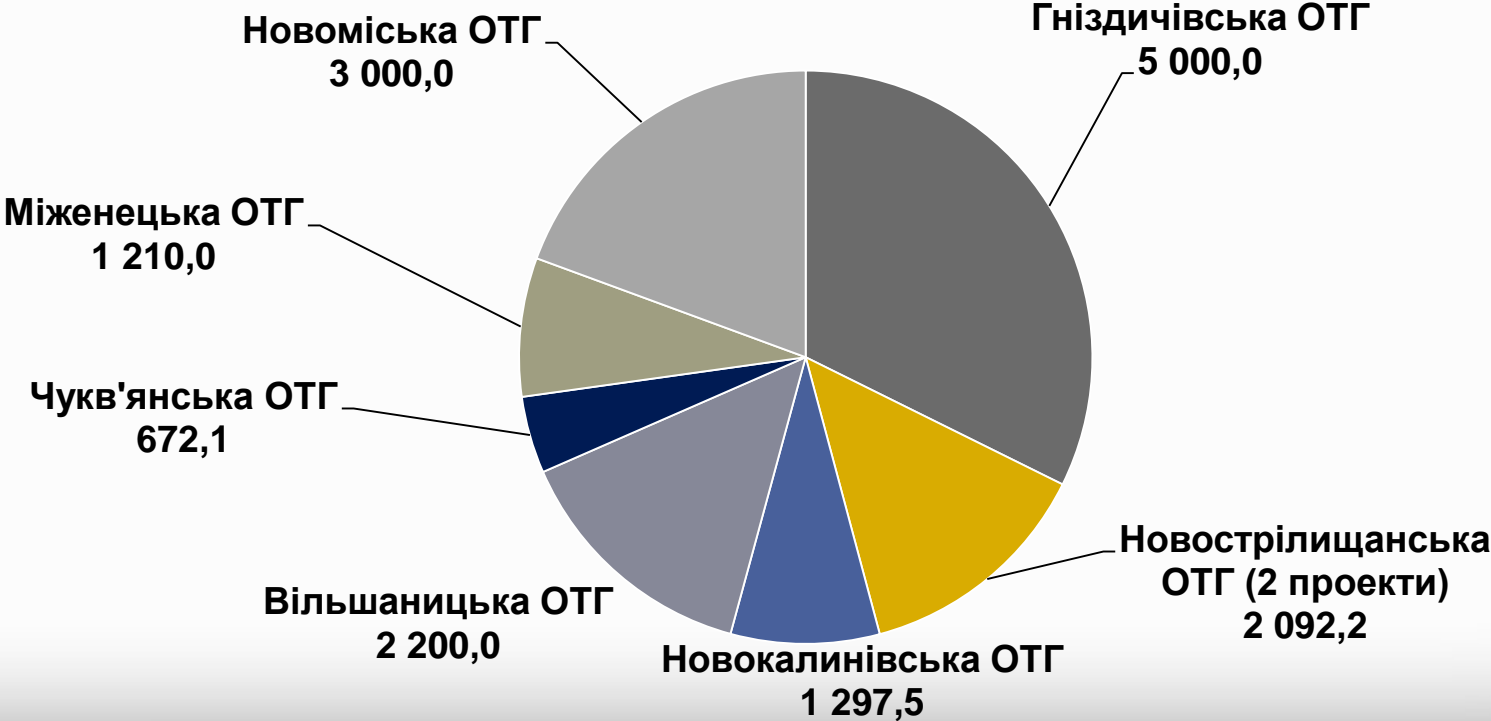

МІКРОПРОЕКТИ ОБ'ЄДНАНИХ ГРОМАД

Унікальна програма для України

6,2 млн. грн.

30 об'єктів

Проблема: відсутність підписаних договорів про міжбюджетні трансфери (ОТГ: Тростянецька, Бабинська, Грабовецька)

Порядок дій:

1. Співфінансування (прийняття рішень відповідними радами)
2. Підписання угод з підрядниками
3. Початок робіт (для освітніх проектів – **не пізніше 01.08.2016**)

20.07.2016 – Засідання конкурсної ради (зміни до назв проектів)

МІКРОПРОЕКТИ: ФІНАНСУВАННЯ В ОТГ

